

Prosjektnavn:	Masterdatakilder for forskning
Ansvarlig virksomhet:	Unit
Prosjekteier:	Frode Arntsen
Prosjektleder:	Katrine Weisteen Bjerde
Rapportdato	18.5.2020


	Forrige	Nå	Trend
Fremdrift	Green	Yellow	Yellow
Økonomi	Green	Green	Green
Ressurser	Green	Yellow	Yellow
Kvalitet	Green	Green	Green
Avhengigheter	Green	Green	Green
Risiko	Green	Yellow	Yellow

Oppsummering

Prosjektet er godt i gang med detaljplanleggingen, og det er enighet om langsiktig målbilde for arkitektur. Oppstart av selve gjennomføringen er forsinket pga endrede forutsetninger i tilgang til personressurser ift opprinnelig plan. Tiltak er iverksatt for å korrigere avviket. Resultatet av detaljplanleggingen med revidert forslag til fremdriftsplan blir presentert i første styringsgruppemøte primo juni.

Aktiviteter Utført	Positivt	Bekymringer	Neste Periode
<ul style="list-style-type: none"> Bemanning er avtalt Referansegruppe er etablert for detaljering av brukerbehov, og første møter med gruppen er gjennomført Styringsgruppen er komplettert Langsiktig målbilde for arkitektur er skissert Teknisk løsning er gjennomgått og justert Dialog er startet på alle punkter det man har avhengigheter Intern kvalitetssikring utført og tiltak planlagt 	<ul style="list-style-type: none"> God dialog i prosjektgruppen Klare, felles målbilder i tråd med Gartners anbefalinger Stort engasjement i referansegruppen og positive tilbakemeldinger på de fremlagte planene 	<ul style="list-style-type: none"> Stor avhengighet av nøkkelpersoner i Unit gir utfordringer med fremdrift Viktig for ytterligere gevinstrealisering at videre utvikling også planlegges, så man ikke blir stående med minimumsløsningen 	<ul style="list-style-type: none"> Slutføre detaljplanlegging Starte utviklingsarbeid Gjennomføre planlagte tiltak som resultat av intern kvalitetssikring

Risikovurdering

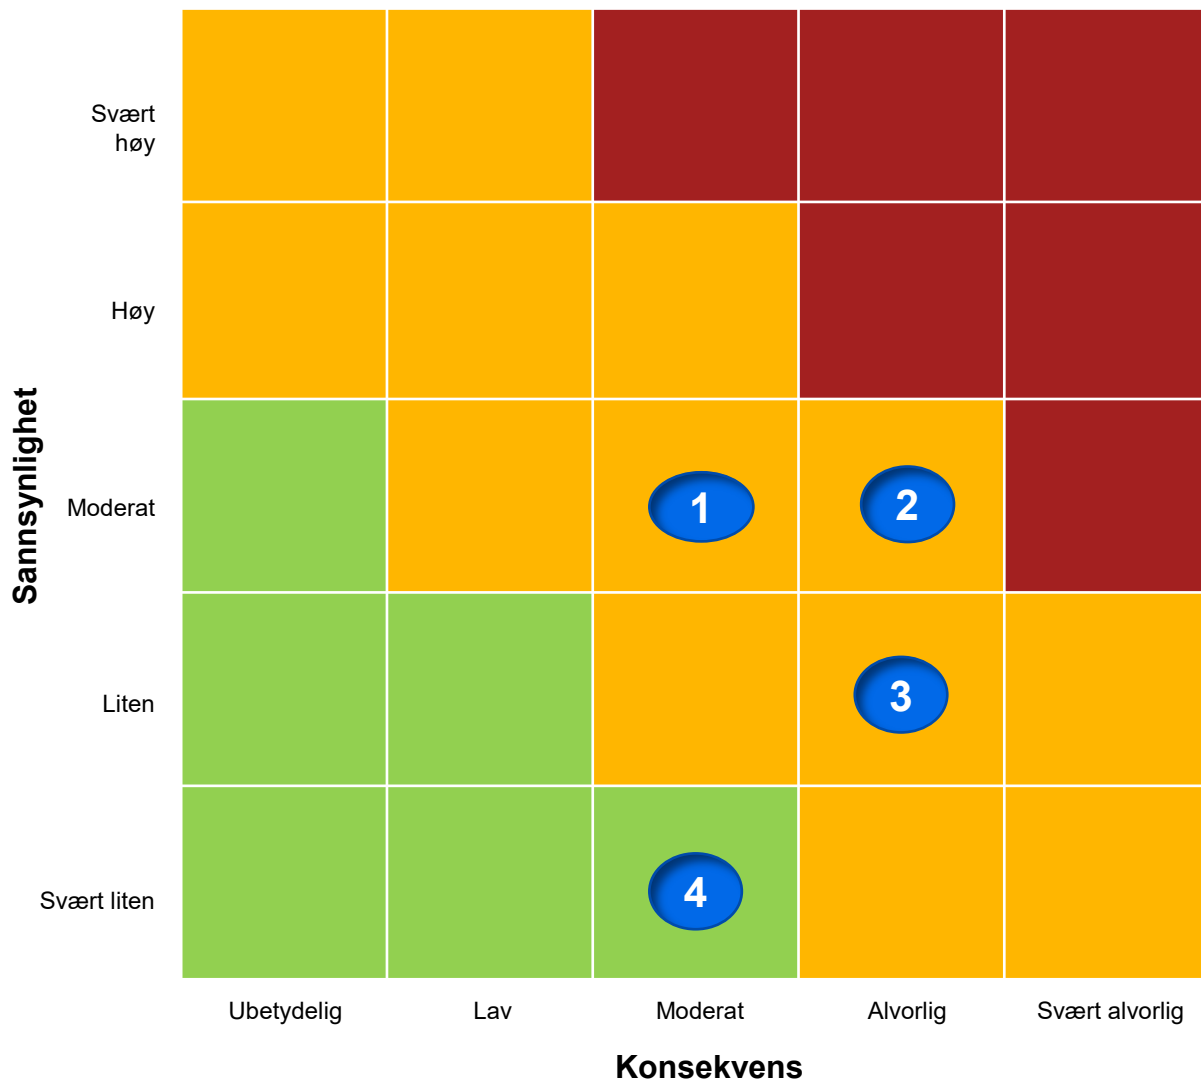

	Risikoelementer
1	Manglende fremdrift pga høy belastning på prosjektleder med andre oppgaver
2	Manglende fremdrift på grunn av at man ikke får tilgang til kapasitet hos utviklere med helt nødvendig nøkkelkompetanse
3	Risiko for at det ikke legges planer for videreutvikling av masterdatakilder for forskning ut over minimumsløsningen som leveres i dette prosjektet.
4	Forsinkelse pga uventede teknologiske utfordringer
5	
6	
7	
8	
9	
10	

