

| | |
|-----------------------|--|
| Prosjektnavn: | Masterdatakilder for forskning |
| Ansvarlig virksomhet: | Unit |
| Prosjekteier: | Frode Arntsen |
| Prosjektleder: | Katrine Weisteen Bjerde Fra 1.9. Finn Filip Finnborud |
| Rapportdato | 13.8.2020 |


| | Forrige | Nå | Trend |
|---------------|---------|--------|--------|
| Fremdrift | Green | Yellow | Yellow |
| Økonomi | Green | Green | Green |
| Ressurser | Green | Yellow | Yellow |
| Kvalitet | Green | Green | Green |
| Avhengigheter | Green | Green | Green |
| Risiko | Green | Yellow | Yellow |

Oppsummering

Arbeid med utvikling av prosjektregister er kommet godt i gang, og de første tjenestene er klare for testing. Oppstart av utvikling for personregisteret er avtalt til september. Kapasiteten i prosjektet er økt ved innleie av ekstern konsulent som prosjektleder. Første møte i styringsgruppen er avholdt.

| Aktiviteter Utført | Positivt | Bekymringer | Neste Periode |
|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Første møte i styringsgruppen er avholdt Første versjon av tjenester for uthenting av åpen informasjon fra prosjektregisteret er klare for testing. Første del av nytt API i sky er laget Det er startet arbeid med å finne teknisk løsning for tilgangsstyring for tjenester som krever dette | <ul style="list-style-type: none"> Prosjektleder med bedre kapasitet er engasjert Utviklingen er godt i gang Tentativt tidspunkt for tilgang til kompetanse fra nøkkelperson i Unit er avtalt Vi har tatt første steg mot å frikoble API og masterdatakilde for prosjekter fra Cistin | <ul style="list-style-type: none"> Risiko for utfordringer med ukjent teknologi har slått til (Tilgangsstyring i skyløsning.) Fortsatt stor avhengighet av nøkkelpersoner i Unit Viktig for ytterligere gevinstrealisering at prosjekt for videre utvikling også planlegges, så man ikke blir stående med minimumsløsningen | <ul style="list-style-type: none"> Beslutte teknisk løsning for tilgangsstyring Videreføre utvikling av prosjektregister Gjennomføre planlagt kompetanseoverføring fra nøkkelperson til andre utviklere Starte utviklingsarbeid på personregister Starte arbeid med forvaltningsrutiner Vurdere å erstatte utgående prosjektleders kompetanse på brukerbehov med annen deltager fra Avd for forskningsstøtte |

Risikovurdering

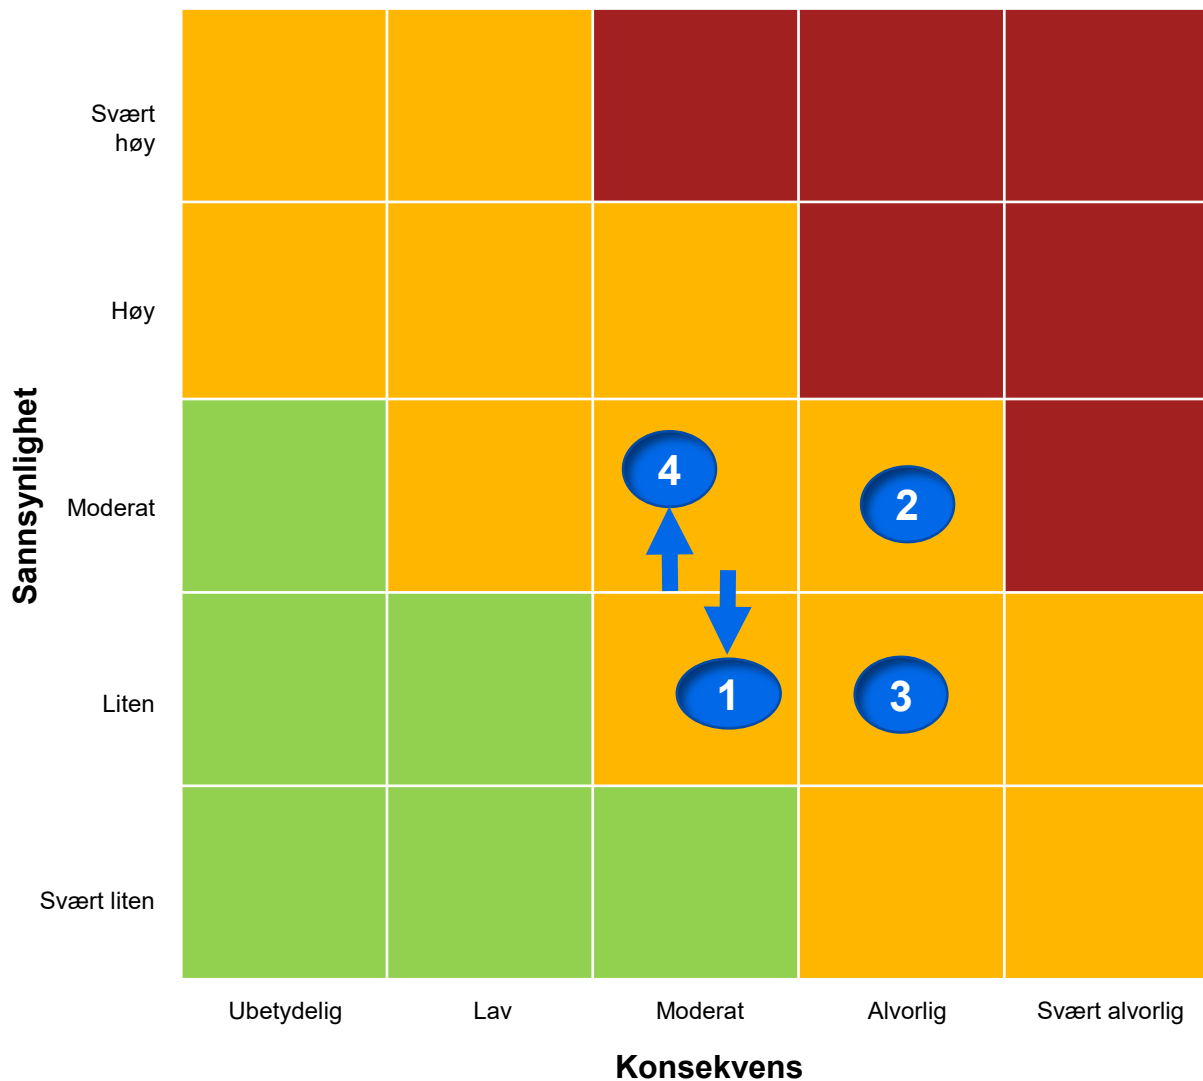

| | Risikoelementer | Tiltak |
|---|--|---|
| 1 | Manglende fremdrift pga høy belastning på prosjektleder med andre oppgaver | Prioritere kompetanseoverføring fra nåværende til ny prosjektleder |
| 2 | Manglende fremdrift på grunn av at man ikke får tilgang utviklere med nødvendig nøkkelkompetanse | Følge tett opp avtalt tidsplan for kompetanseoverføring |
| 3 | Risiko for at det ikke legges planer for videreutvikling av masterdatakilder for forskning ut over minimumsløsningen som leveres i dette prosjektet. | Planlegge prosjekt for videreutvikling allerede nå |
| 4 | Forsinkelse pga uventede teknologiske utfordringer | Prioritere arbeid med å finne god teknisk løsning på autentisering. Etablert samarbeid med Datadelingsprosjektet. |

