


Nasjonal digitaliseringsportefølje

Arbeidslivsportalen - videreutvikling

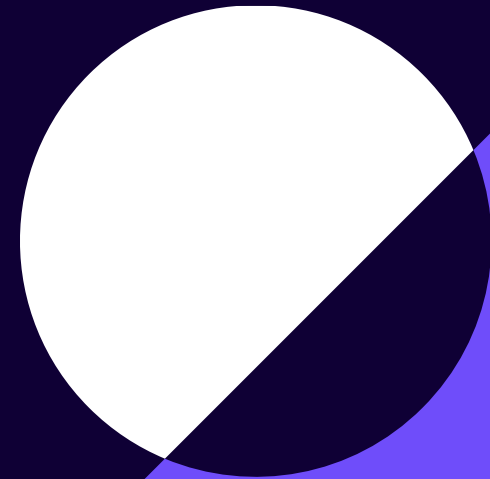

Prosjektnavn:	Arbeidslivsportalen – videreutvikling
Ansvarlig virksomhet:	Studieadministrasjon
Prosjekteier:	Maria Kumle
Prosjektleder:	Jøran Indseth
Rapportdato:	04.05.2022


Oppsummering status

Første del av vurdering (legge inn og vise læringsutbyttebeskrivelser) var planlagt til 4 sprinter, men kan sannsynligvis leveres på tre. Dette gjør at vi akkurat nå ligger an til å levere den viktigste funksjonaliteten knyttet til avtale og vurdering innenfor prosjektets tidsramme. Vi vet imidlertid om problemstillinger knyttet til hvordan tilgangsstyring gjøres i ALP og hvordan praksisstedene vedlikeholdes i databasen som må tas tak i som en del av praksissted-API, praksisavtale og vurdering. Dette er blant annet knyttet til personvern og er spesielt aktuelt for å få store praksissteder som for eksempel sykehus inn i ALP for fullt.

	Forrige	Nå	Trend
Fremdrift	●	●	●
Økonomi	●	●	●
Ressurser	●	●	●
Kvalitet	●	●	●
Avhengigheter	●	●	●
Risiko	●	●	●

Aktiviteter Utført	Positivt	Bekymringer	Neste Periode
<ul style="list-style-type: none"> Første del av avtalesfunksjonalitet er levert og resterende er godt i gang En kompliserte og flere enklere Showstoppers er levert Første del av vurderingsfunksjonalitet er godt i gang, vi forventer snarlig levering Fremskritt i samarbeid med helseforetak om API-integrasjon 	<ul style="list-style-type: none"> Mindre sykdom, bedre kapasitet i teamet sammenlignet med forrige periode Første del av vurdering var enklere enn antatt Vi følger veikart og ligger akkurat nå an til å levere den viktigste funksjonaliteten knyttet til avtale og vurdering innenfor prosjektperioden 	<ul style="list-style-type: none"> Tilgangsstyring og endring av praksissteder er oppgaver med uavklart omfang og som kan vokse Mulig showstopper knyttet til lærerutdanning, som trenger bedre støtte for å bestille praksisplasser for ulike fagkombinasjoner. 	<ul style="list-style-type: none"> Ferdigstille avtalesfunksjonalitet Funksjonalitet for å håndtere avtale- og stedsendringer Midtveis og sluttvurdering FS integrasjon vurdering Showstoppers knyttet til kopiering og store praksissteders behov for samlet oversikt over bestilling og besvarelser

Risikovurdering

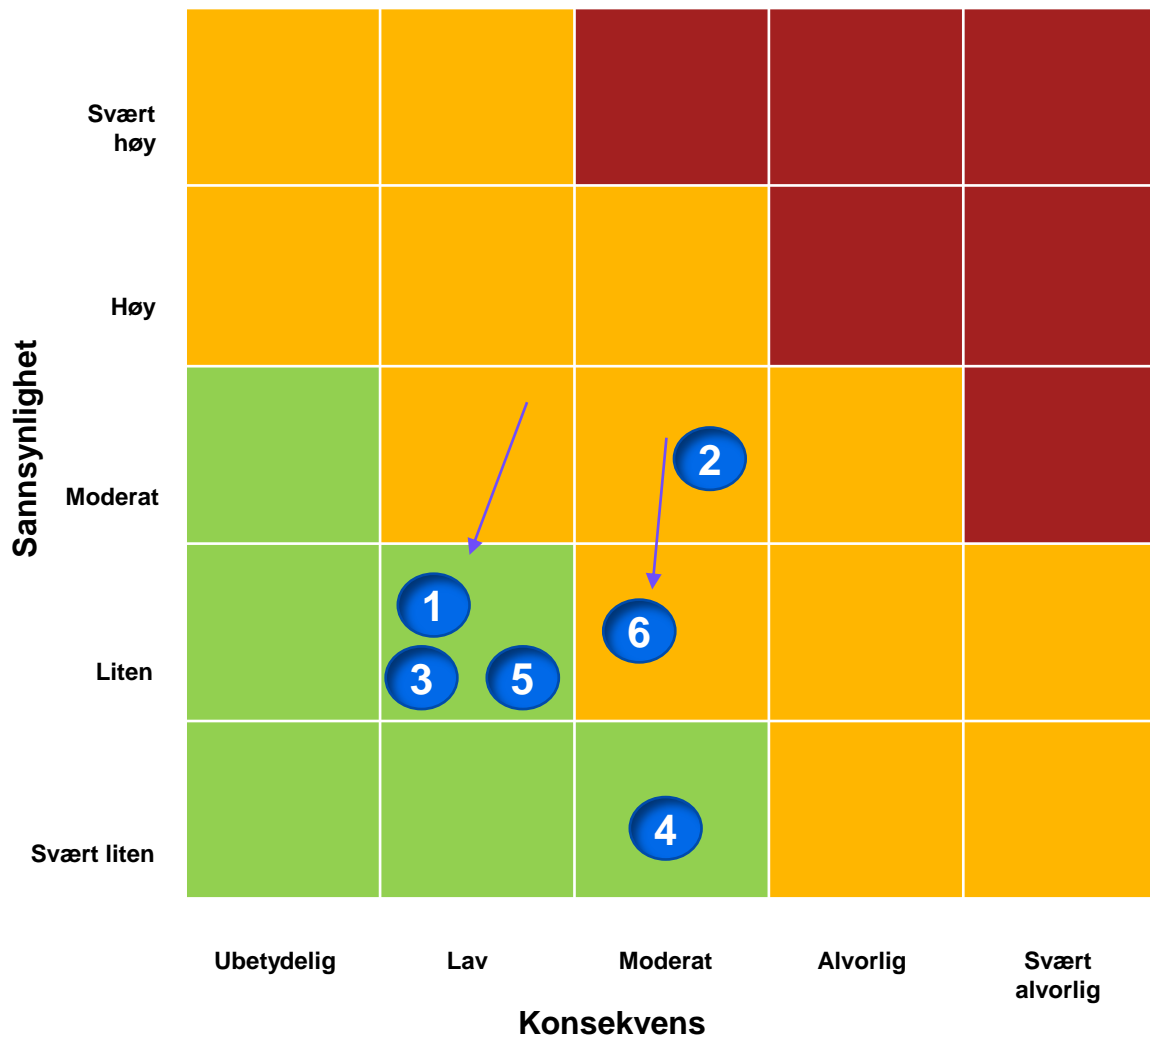

● Høy sannsynlighet, alvorlig konsekvens
 ● Moderat sannsynlighet, moderat konsekvens
 ● Lav sannsynlighet, lav konsekvens

Risikoelementer		Tiltak
1	Kapasitet	Hovedsakelig på grunn av sykdom i perioden.
2	«Scope creep»	Klarere rammeverk for prioritering av oppgaver som ikke er definert i bestilling
3	Utrulling og opplæring	Tas inn som et element i prosjektet. Nye brukerveiledninger
4	Involvering praksissteder	Referansegruppen bistår i sikring av involvering. Praksissteder har diverse behov.
5	Teknisk gjeld FS	Fokus på å levere «godt nok» i utviklingsperioden, samarbeid med FS-arkitektteam rettet mot FS-integrasjon.
6	Avtale- og praksisstedhierarki	Fokus på å levere godt nok i utviklingsperioden. Avtalehierarki og praksisstedhierarki er komplisert, utviklingsoppgaver som berører dette er tidkrevende.
7		
8		

Risiko er forhold som kan forstyrre prosjektets planer og gevinstrealisering (tid, kost, kvalitet, ressurser, marked, gevinster)

Avhengigheter

#	Avhengighet	Kategori	Beskrivelse
1	Ingen nye showstoppers dukker opp	<ul style="list-style-type: none"> • Brukere • Teknisk 	Hvis nye forhold dukker opp som kan kategoriseres som stoppende for en full utrulling kan disse påvirke fremdrift og måloppnåelse
2	Drift av fase 1	<ul style="list-style-type: none"> • Data • Teknisk 	Hvis driftsstopp vil prosjektet forsinkes, utviklere bruker tid på support. Skyldes i stor grad datamodell.
3	Integrasjon med Felles Studentsystem (FS)	<ul style="list-style-type: none"> • Data • Teknisk 	ALP er avhengig av informasjonsutveksling med FS. Nyutvikling vår 2022 krever integrasjon mot FS på flere områder enn før.
4	Adgang til referansegrupper	<ul style="list-style-type: none"> • Brukere 	Videreføring av referansegrupper for sikring av måloppnåelse
5	Forprosjekt for modernisering av studieadministrative fellessystemer	<ul style="list-style-type: none"> • Logiske 	ALP skal inngå som en del av FS økosystemet, arbeidet med ALP må spille sammen med retningen for dette arbeid.

Avhengigheter påvirker rekkefølge og tidspunkt for aktiviteter. Rammebetingelser begrenser eller setter premisser for tid, kost, kvalitet og gevinster. Begge deler er kjente, og vesentlige avhengigheter og rammebetingelser bør være inkludert i oversikten over avhengigheter. Noen eksempler på kategorier:

- *Logiske:* Interne og eksterne aktiviteter i en bestemt rekkefølge
- *Ressurser:* I prosjektet eller spesialister
- *Data*
- *Brukere:* Interne eller eksterne aktiviteter ovenfor brukerne
- *Tekniske:* Arkitektur, infrastruktur, integrasjoner
- *Regulatoriske:* Vedtak, styrende dokumenter
- *Beslutninger:* Eksterne og interne
- *Finansering*

